

Detailablauf der Schornsteinnachrüstung

Ausführungs-Beschreibung für den nachträglichen Einbau eines Schornsteines innerhalb eines Tages

Vorbereitungs-Arbeiten:

Erdgeschoss

- Bodenbelag und Möbel mit Folie abdecken
- Staubschutzwände aufstellen
- Aufbau aller erforderlichen Geräte
- Auffangwanne unter der Betondecke im Bereich des zu erstellenden Deckendurchbruchs einbauen
- Estrich einschneiden
- Betondecke mit einer Betonsäge einsägen
- Betonkern ausbauen und fachgerecht entsorgen

Dachgeschoss/Spitzboden

- Deckenschalung im Spitzboden ausschneiden
- Decke im Spitzboden öffnen
- Rigipsdecke und Schalung in den Abmaßen des neuen Schornsteines ausschneiden
- Dachstuhl öffnen
- Abbruch-Material fachgerecht entsorgen

Dach

- Kran aufbauen
- Schornsteingerüst aufbauen
- Dachpfannen aufnehmen und seitlich lagern




NEHRMANN
BAUUNTERNEHMEN

Bauen mit Vertrauen

Detailablauf der Schornsteinnachrüstung

Einbau-Arbeiten:

- Fertigteil-Schornstein Teil 1 vorbereiten und einbauen
- Fertigteil-Schornstein Teil 2 vorbereiten und einbauen

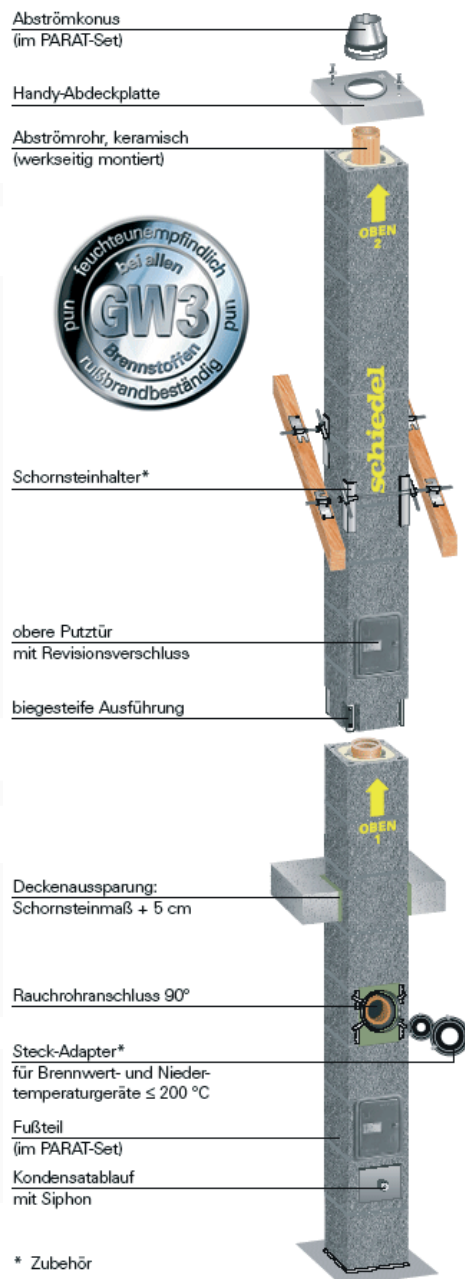

Detailablauf der Schornsteinnachrüstung

Fortsetzung Einbau-Arbeiten:

- Schornstein-Halterung einbauen
- Seitlich gelagerte Dachpfannen anarbeiten
- Schornstein-Einfassung einbauen
- Fertigteilkopf vorbereiten und einbauen
- Schornsteingerüst demontieren
- Dachfläche reinigen
- Kran abbauen
- Rigipsdecke wieder herstellen
- Dämmung und Schalung im Dachgeschoss einbauen
- Spitzboden reinigen
- Schornstein im Dachgeschoss verputzen
- Deckenfuge schließen und Estrich ausbessern
- Dachgeschoss reinigen und Schutzmassnahmen abbauen
- Erdgeschossdecke an den neuen Schornstein anarbeiten
- Schornstein im Erdgeschoss verputzen
- Schornstein-Reinigungstür einbauen
- Sämtliche Schutzmaßnahmen abbauen
- Material und Geräte verladen
- Abnahme durch den Auftraggeber

Ihr Schornstein ist fertig! Sobald der Kamin oder Kachelofen eingebaut ist, können Sie die Vorteile Ihres neuen Schornsteines und die Gemütlichkeit am Kamin genießen.
